Proje takvimi

Üretim Hattı Modernizasyonu

Proje yöneticisi: [Ad Soyad] Rapor: 15 Ekim 2026 Örnek veriler

Aşamalar ve kritik tarihler


Aşama	Plan / güncel bitiş	05.10	12.10 Bu hafta	19.10	26.10	02.11	09.11	16.11
Tasarım	09.10 / 09.10	Bitti						
Tedarik	23.10 / 30.10		Devam	Plan	Güncel			
Kurulum	06.11 / 13.11				Plan	Plan	Güncel	
Test	12.11 / 19.11						Plan	Güncel
Devreye alma	13.11 / 20.11						Plan	Güncel

Kritik alan: motor teslimi. 23 Ekim hedefi için alternatif tedarikçi gerekli.

Efor: 8 kişi, 240 saat

Departman	Kişi	Saat
Mühendislik	3	96
Üretim	2	72
Satın alma	1	24
Kalite	1	24
Proje yönetimi	1	24
TOPLAM	**8**	**240**

Tamamlanma durumu

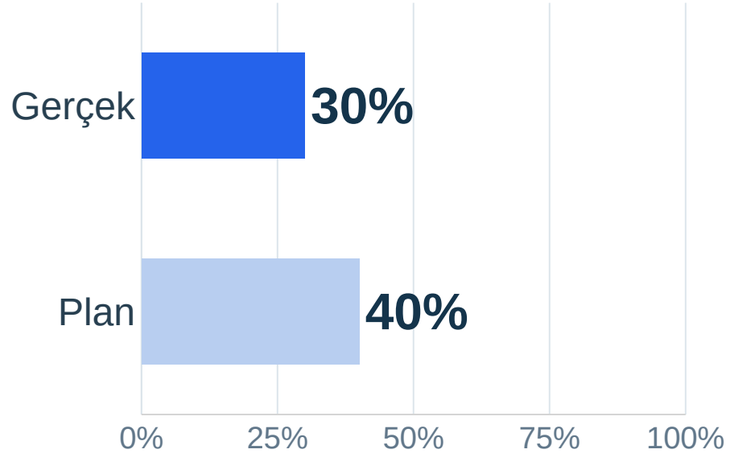

Planın 10 puan gerisinde

Hedef bitiş: 13 Kasım
Güncel tahmin: 20 Kasım
Takvim sapması: +7 gün

Mevcut aşama: Tedarik

Maliyet, bütçe ve haftalık işler


Üretim Hattı Modernizasyonu

Proje yöneticisi: [Ad Soyad] Rapor: 15 Ekim 2026 Örnek veriler

Maliyet dökümü (bin TL, KDV hariç)

Kalem	Gerçekleşen	Kalan	Tahmini toplam
Efor	240	360	600
Malzeme / alınan	180	0	180
Alınacak malzeme	0	320	320
TOPLAM	**420**	**680**	**1100**

Bütçe karşılaştırması (bin TL)

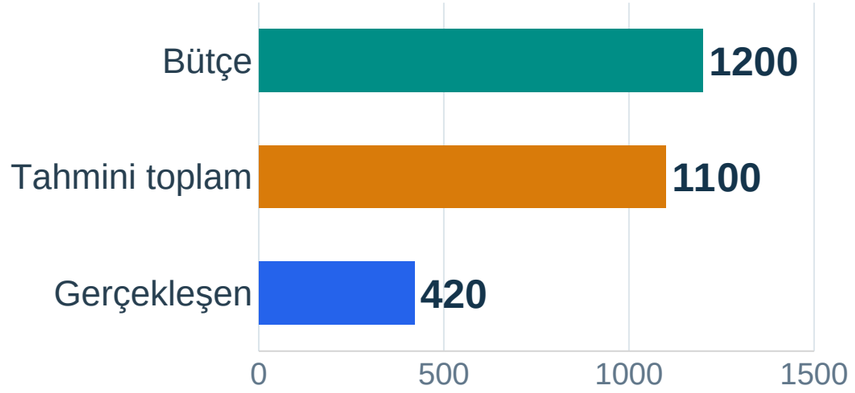

Bütçe: 1.200 bin TL **Tahmini toplam: 1.100 bin TL** **Öngörülen bütçe payı: 100 bin TL**

Riskler ve önlemler

Risk / seviye / etki	Önlem / sorumlu / tarih
Motor tedariki **Yüksek, +7 gün**	Alternatif teklifi kesinleştir. Satın alma, 16.10
Saha kapasitesi **Orta, testte +2 gün**	2 üretim personelini ayır. Üretim, 19.10

Yapılanlar / yapılacaklar

Durum	İş / tarih ve sorumlu
Yapıldı	Tasarım onayı alındı. 09.10, Mühendislik
Sıradaki	Motor siparişini kesinleştir. 16.10, Satın alma
Sıradaki	Kurulum ekibini ayır. 19.10, Üretim
