
Projelerimin haftalık takvimi

Proje yöneticisi: [Ad Soyad] Rapor: 15 Ekim 2026 3 örnek proje

Tamamlanma: gerçek ve plan

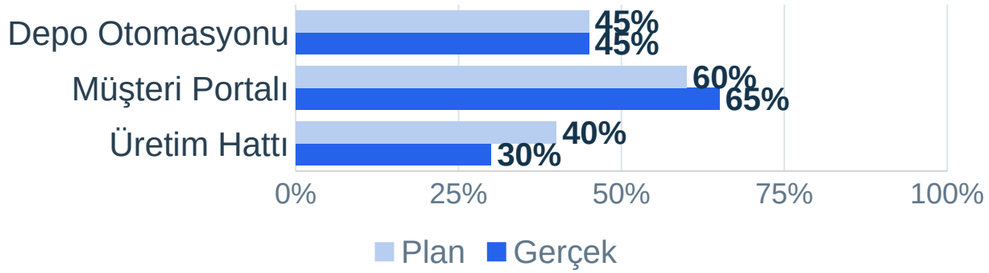

Güncel haftalık takvim (turuncu: kritik)

Proje	12.10 Bu hafta	19.10	26.10	02.11	09.11	16.11	23.11
Üretim	Tedarik	Tedarik	Motor	Kurulum	Kurulum	Kabul	
Portal	Geliş.	Test	Pilot	Canlı			
Depo	Analiz	Yazılım	Yazılım	Enteg.	Test	Pilot	Kabul

Proje	Mevcut aşama	Plan bitiş	Güncel bitiş	Plana göre	Kritik alan
Üretim Hattı	Tedarik	13.11	20.11	**10 puan geride 7 gün gecikme**	Motor teslimi, 23.10 hedefi. Alternatif tedarikçi gerekli.
Müşteri Portalı	Geliştirme	06.11	03.11	**5 puan ileride 3 gün erken**	Güvenlik testleri, 19.10. Test ortamına erişim gerekli.
Depo Otomasyonu	Analiz	27.11	27.11	**Planında 0 gün sapma**	Yedek ağ bağlantısı, 20.10. Saha erişimi doğrulanmalı.

Departman bazında efor (kişi / rapor tarihine kadar saat)


Proje	Toplam kişi / saat	Mühendislik	Üretim	Satın alma	Kalite	Bilgi tekn.	Proje yön.
Üretim Hattı	**8 kişi 240 saat**	3 kişi 96 saat	2 kişi 72 saat	1 kişi 24 saat	1 kişi 24 saat	—	1 kişi 24 saat
Müşteri Portalı	**5 kişi 160 saat**	—	—	—	1 kişi 24 saat	3 kişi 120 saat	1 kişi 16 saat
Depo Otomasyonu	**8 kişi 192 saat**	2 kişi 48 saat	1 kişi 24 saat	1 kişi 16 saat	1 kişi 24 saat	2 kişi 64 saat	1 kişi 16 saat

Projelerimin maliyet, risk ve işleri

Proje yöneticisi: [Ad Soyad] Rapor: 15 Ekim 2026 3 örnek proje

Maliyet ve bütçe (bin TL, KDV hariç)

Proje	Gerçek efor	Alınan malz.	Kalan efor	Alınacak malz.	Tahmini toplam	Bütçe	Bütçe farkı
Üretim Hattı	240	180	360	320	1100	1200	100
Müşteri Portalı	220	60	270	300	850	800	-50
Depo Otomasyonu	160	220	240	280	900	950	50
TOPLAM	620	460	870	900	2850	2950	100

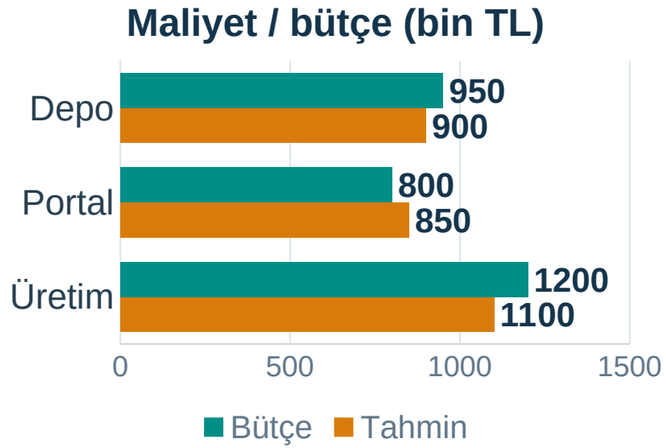

Müşteri Portalı: 50 bin TL bütçe aşımı bekleniyor.

Riskler, yapılanlar ve sıradaki işler

Proje	Risk / etki / önlem	Yapılanlar	Sıradaki iş / sorumlu / tarih
Üretim Hattı	Yüksek: motor teslimi +7 gün. Önlem: alternatif teklif. Satın alma, 16.10	Motor teknik onayı alındı. 14.10, Mühendislik	Motor siparişini kesinleştir. Satın alma, 16.10
Müşteri Portalı	Orta: güvenlik testinde +2 gün. Önlem: test ortamını aç. BT, 19.10	Arayüz testleri tamamlandı. 14.10, BT	Güvenlik testini başlat. BT, 19.10
Depo Otomasyonu	Yüksek: ağ erişimi kesilebilir. Önlem: yedek bağlantı. BT, 20.10	Saha keşfi tamamlandı. 13.10, Üretim	Yedek ağ bağlantısını kur. BT, 20.10
