
Projelerimin haftalık özeti

Ayşe Yılmaz / 15 Ekim 2026 / Örnek portföy

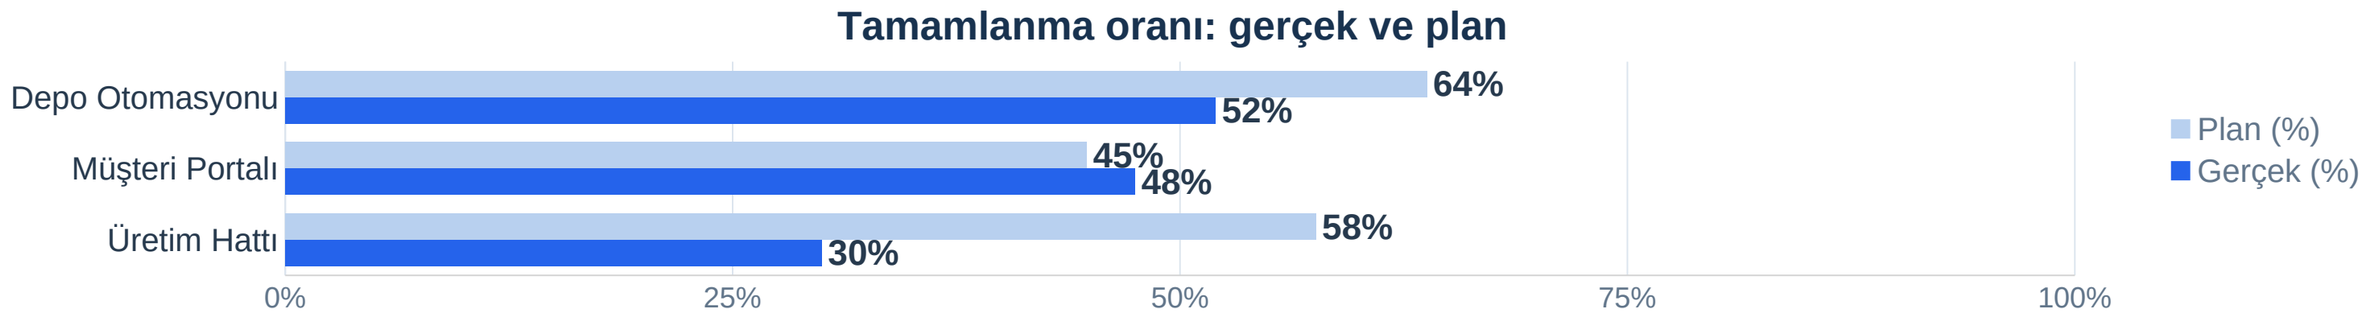

Proje / aşama	İlerleme gerçek / plan	Takvim plan / güncel	Efor kişi / saat	Birimlere göre efor (saat)	Risk
Üretim Hattı Tedarik / saha	30,0% Plan 57,6%	Plan 04.12 11.12 (+7 gün)	5 kişi 648 saat	Müh. 110 / Ürt. 127 / SA 144 Klt. 155 / PY 112	**Yüksek**
Müşteri Portalı Geliştirme	47,5% Plan 44,8%	Plan 27.11 27.11 (planında)	4 kişi 536 saat	BT 269 / Klt. 155 / PY 112	**Orta**
Depo Otomasyonu Donanım / yazılım	52,0% Plan 63,8%	Plan 20.11 04.12 (+14 gün)	6 kişi 811 saat	Müh. 157 / Ürt. 114 / SA 144 Klt. 155 / PY 112 / BT 129	**Yüksek**

Maliyet ve bütçe (bin TL, KDV hariç)

Proje	Gerçek efor	Gerçek alım	Kalan efor	Kalan alım	Tahmini toplam	Bütçe	Bütçe farkı
Üretim Hattı	526,4	400,0	527,0	540,0	1.993,4	2.200,0	206,6
Müşteri Portalı	484,6	125,0	396,0	65,0	1.070,6	950,0	-120,6
Depo Otomasyonu	679,8	260,0	288,0	185,0	1.412,8	1.450,0	37,2


Haftalık işler ve yönetimden beklenti

Ayşe Yılmaz / 15 Ekim 2026 / Örnek portföy

Bu hafta yapılanlar ve sıradaki işler

Proje	Yapılanlar	Sıradaki iş
Üretim Hattı	Kabul test listesi tamamlandı.	Alternatif motor teklifini netleştir.
Müşteri Portalı	Tasarım onayı alındı.	Entegrasyon test hesabını aç.
Depo Otomasyonu	Pilot süreç analizi tamamlandı.	Kısmi sevkiyatı ve sayımı planla.

Üretim: haftalık ilerleme

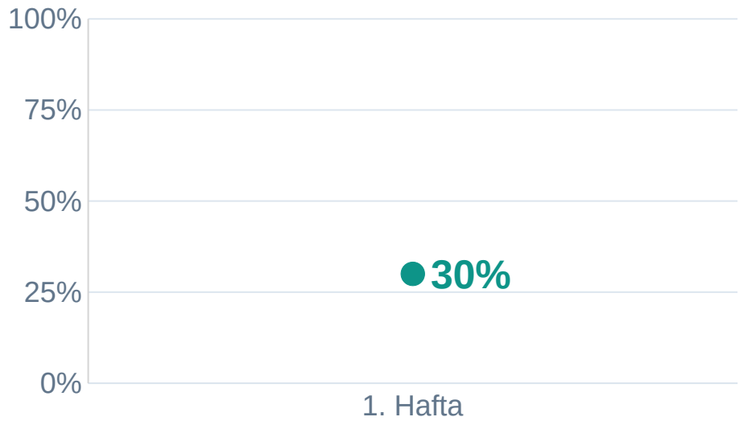

Yeni hafta ve oranı, grafiğin veri tablosuna ekleyin.

BEKLENTİ

Proje	İstenen karar / destek	Karar mercii	Son tarih	Gecikirse etkisi
Üretim Hattı	Alternatif motor tedarikçisini onaylayın.	Operasyon Direktörü	20.10	Kurulum 7 gün ötelenebilir.
Müşteri Portalı	121 bin TL ek bütçe onayı.	Genel Müdür / Finans	19.10	Güvenlik testleri gecikebilir.
Depo Otomasyonu	Pilot kurulum için 2 günlük saha desteği.	Üretim Direktörü	16.10	Kabul takvimi 14 gün sarkabilir.
